

# 玛纳斯县妇计中心妇女儿童 服务能力提升项目

## 绩效评价报告

项目名称：玛纳斯县妇计中心妇女儿童  
服务能力提升项目

实施单位：玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心

委托单位：玛纳斯县财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所





## 摘 要

### 一、项目概述

#### （一）项目背景及目的

随着玛纳斯县经济的稳步增长，群众的收入和生活水平不断改善，健康需求日益提高，到医院就医的患者越来越多。近几年来，政府不断加强基层医疗机构建设，使群众的基本医疗需求得到保障。但县级医院妇产科、儿科资源缺乏，服务能力不足，妇女儿童看病难、住院难的问题突出。该项目的实施具有政策、技术、管理、区位、交通、规模、环境等多方面的资源优势，设计起点高、服务能力强，对解决全县妇女儿童看病难住院难问题、促进玛纳斯县妇幼卫生事业发展都具有明显的作用，能够收到良好的效益。

项目建设完成后，将使妇计中心医院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋的设备配置上满足妇计中心医院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用，极大地改善了当地广大农民 群众看病环境和就医条件。该项目的实施，解决了妇计中心医院现有业务用房狭窄或缺陷的问题，将使妇计中心医院卫生医疗条件和工作条件得到较大的改善，有利于提高当地群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。社会效益突出，经济效益较好。

#### （二）项目实施情况

项目计划改建玛纳斯县妇计中心面积 2000 平方米，主要改造装修手术室、化验室、医废处置间、档案室，以及改造楼层中央空





调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施。新建预检分诊室约 300 平方米、食堂约 30 人位。同时配套信息化系统、购置医疗设备等。

截至 2023 年 12 月 31 日，已完成妇计中心 2975.35 平方米改造装修，完成改造楼处配套的中央空调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施安装，完成医疗设备购置及验收。

### （三）绩效目标

#### 1. 总目标

通过项目建设，将使妇计中心医院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋的设备配置上满足妇计中心医院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用，极大地改善当地广大农民群众看病环境和就医条件。

#### 2. 年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

总体目标	年度目标
------	------



通过项目建设,将使妇计中心医院达到实行统一建设标准和技术规范,功能完善,满足基本要求。在房屋的设备配置上满足妇计中心医院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用,极大地改善当地广大农民群众看病环境和就医条件。

项目拟投入 2000 万元,主要实施内容为:改造装修手术室、化验室、医废处置间、档案室等共计 2000 平方米,改造楼层中央空调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施,购置医疗设备,通过项目实施有效改善妇幼保健医疗条件,提升妇幼保健服务水平,使受益对象满意度达到 90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	妇计中心改造装修面积	≥ 2000 平方米
		采购医疗设备数量	≥ 30 台(套)
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程开工及时率	=100%
		工程完工及时率	=100%
		资金支付及时率	=100%
	成本指标	土建及安装费用	≤ 860.23 万元
		设备购置费用	≤ 1139.77 万元
效益指标	社会效益指标	改善妇幼保健医疗条件	有效改善
		提升妇幼保健服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%



## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 97 分，评价等级为“优”。

### （二）预算执行情况

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目，预算资金 2000 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，实际支出 2000 万元，预算执行率 100%。

### （三）项目绩效情况

该项目的实施，解决了妇计中心医院现有业务用房狭窄或缺陷的问题，使妇计中心医院卫生医疗条件和工作条件得到较大的改善，有利于提高当地群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。社会效益突出，经济效益较好。

在项目开展过程中，该项目能严格按照项目财务管理办法执行。从财务流程各环节控制规范财务行为，在项目实施中能压实责任，对项目资金专账核算，保证资金专款专用，保障项目预算按照进度执行。

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 100%，满意度水平较好。



### 三、经验、问题和建议

#### (一) 主要经验及做法

1. 加强支付流程。财务根据相关领导签字审批单进行支付款，付款手续必须齐全，收款信息必须与合同方信息一致，收取任何款项必须开具收款收据。

2. 加强管理工作，完善财务付款程序及规定，合理控制单位财务支出，对支付工程款、设备购置款与有关部门请示，财务接到审批有效的付款申请单后安排付款。

3. 统筹协调安排，保障资金运行。玛纳斯县财政资金下达至玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心后由单位统筹安排，确保资金及时到位并高效使用，推进项目有序开展及实施。

4. 目标责任落实到位。强化组织、管理、监督职责，进一步明确目标任务，靠实工作责任，加快项目推进，确保按期高质完成项目任务。

#### (二) 存在的问题

1. 绩效目标编制不够科学、全面。

项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。本项目设置了产出指标（含数量、质量、时效、成本）、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。但通过分析项目绩效目标表发现存在指标设置不够科学、全面的情况，如原数量指标仅设置为“改造装修面积=2000平方米”无法有效考核项目中的设备购置工作，原成本指标“债券





资金投入=2000 万元”，未能细化成本指标，未能体现出项目细分支出方向。

## 2. 项目资料整理、归档工作不够及时。

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对佐证材料的需求，需要相关负责人配合提供资料，但部分档案资料不完备未及时提供。

### （三）建议和改进措施

#### 1. 提升绩效目标编制水平。

绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与其项目的实施计划相一致，建议项目实施单位在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出目标和效果目标，使目标值与年度任务数或计划数相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。

#### 2. 加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性。

建议玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心采取定期与不定期的检查，对必要的信息及时采集调研，了解各项工作每个绩效节点应上报的绩效数据，保障数据填报真实性，为预算绩效管理工作提供有效依据。

#### 3. 加强档案管理。



建议玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心加强项目前期审批、全过程绩效管理档案资料及时收集、整理、归档管理，使档案管理工作规范化、标准化。

# 目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目资金情况.....	3
（三）项目绩效目标情况.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的.....	5
（二）绩效评价原则.....	5
（三）绩效评价依据.....	6
（四）绩效评价工作程序及方法.....	7
（五）绩效评价指标体系及标准.....	12
三、绩效评价综合情况及结论.....	12
（一）绩效评价综合结论.....	12
（二）绩效目标实现情况.....	13
四、绩效评价情况分析.....	14
（一）项目决策情况.....	14
（二）项目管理情况.....	16
（三）项目产出情况.....	19
（四）项目效益情况.....	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	24
（一）主要经验及做法.....	24
（二）存在的问题.....	25
六、有关建议.....	26
七、其他需说明的问题.....	26
（一）关于评价责任的说明.....	26
（二）本次绩效评价的局限性.....	27
附件： .....	28



## 玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受玛纳斯县财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项的背景及目的

随着玛纳斯县经济的稳步增长，群众的收入和生活水平不断改善，健康需求日益提高，到医院就医的患者越来越多。近几年来，政府不断加强基层医疗机构建设，使群众的基本医疗需求得到保障。但县级医院妇产科、儿科资源缺乏，服务能力不足，妇女儿童





看病难、住院难的问题突出。该项目的实施具有政策、技术、管理、区位、交通、规模、环境等多方面的资源优势，设计起点高、服务能力强，对解决全县妇女儿童看病难住院难问题、促进玛纳斯县妇幼卫生事业发展都具有明显的作用，能够收到良好的效益。

项目建设完成后，将使妇计中心医院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋的设备配置上满足妇计中心医院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用，极大地改善了当地广大农民群众看病环境和就医条件。该项目的实施，解决了妇计中心医院现有业务用房狭窄或缺陷的问题，将使妇计中心医院卫生医疗条件和工作条件得到较大的改善，有利于提高当地群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。社会效益突出，经济效益较好。

## 2. 项目实施主体

该项目实施主体为玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心。主要职责为：承担玛纳斯县妇女儿童健康保健、孕产妇及儿童死亡监测、优生优育服务、婚检服务、对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理、培训各级妇幼卫生保健人员、上级对下级妇幼保健单位特别是妇幼保健机构进行业务技术指导、开展妇幼保健科研工作、广泛深入的开展妇幼健康教育、妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作，提供计划生育技术服务，为广大育龄夫妇提供安全、有效、优质的避孕节育服务，提高避孕节育全程服务和生殖保健服务水平，建立管理信息系统，通过多种方式和途径，有针对性地进行宣传教育，并做好信息的收集、分析与反馈。



### 3. 项目主要内容

项目计划改建玛纳斯县妇计中心面积 2000 平方米，主要改造装修手术室、化验室、医废处置间、档案室，以及改造楼层中央空调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施。新建预检分诊室约 300 平方米、食堂约 30 人位。同时配套信息化系统、购置医疗设备等。

### 4. 项目实施情况

截至 2023 年 12 月 31 日，已完成妇计中心 2975.35 平方米改造装修，完成改造楼处配套的中央空调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施安装，完成医疗设备购置及验收。

#### （二）项目资金情况

##### 1. 预算情况

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目预算资金 2000 元，截止 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 2000 万元，资金到位率为 100%。

##### 2. 预算执行情况

该项目 2022 年实际支出资金 2000 万元，预算资金执行率为 100%。详细资金支出明细见“附件 2：玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目资金支付明细表”。

#### （三）项目绩效目标情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善



后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

总体目标		年度目标	
通过项目建设，将使妇计中心医院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋的设备配置上满足妇计中心医院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用，极大地改善当地广大农民群众看病环境和就医条件。		项目拟投入 2000 万元，主要实施内容为：改造装修手术室、化验室、医废处置间、档案室等共计 2000 平方米，改造楼层中央空调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施，购置医疗设备，通过项目实施有效改善妇幼保健医疗条件，提升妇幼保健服务水平，使受益对象满意度达到 90%以上。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	妇计中心改造装修面积	≥ 2000 平方米
		采购医疗设备数量	≥ 30 台（套）
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程开工及时率	=100%
		工程完工及时率	=100%
		资金支付及时率	=100%
	成本指标	土建及安装费用	≤ 860.23 万元
		设备购置费用	≤ 1139.77 万元





效益指标	社会效益指标	改善妇幼保健医疗条件	有效改善
		提升妇幼保健服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目从决策、管理、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论。

通过开展绩效评价，了解玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目目标设定情况、资金分配、使用及管理情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、资金使用效果和绩效目标完成情况，项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据，为玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目管理提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政性资金使用效益。

### （二）绩效评价原则

#### 1. 科学公正、客观、真实原则。





严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

## 2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性、公平性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

## 3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

### （三）绩效评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；

4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；



5. 关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）；
6. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
7. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；
8. 关于印发《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预〔2018〕192号）；
9. 玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心提交的绩效自评报告及自评表；
10. 玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心提交的项目申请、可行性研究报告、实施方案、中标通知书、合同、财政资金支付凭证等项目基础资料；
11. 适用于该项目的其他法律法规及规章制度。

#### （四）绩效评价工作程序及方法

##### 1. 绩效评价工作程序

（1）前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

##### （2）成立评价工作组。



(3) 开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查。在对项目了解的基础上与预算单位主管项目人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。

(4) 明确项目绩效目标。评价人员根据项目立项、绩效考评办法等相关资料以及经与预算单位主管项目人员充分沟通，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。

(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与玛纳斯县财政局和预算单位主管项目人员充分沟通，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据专项资金相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据项目承担单位提供的项目相关资料，进行分类、整理、分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。

(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目承担单位需提交的资料清单，明确项目





执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。我们将项目基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与预算单位、玛纳斯县财政局相关科室以及绩效评价专家充分交流、共同研究，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

(11) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位项目主管人员沟通，根据项目承担单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求项目主管部门意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2、组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

(1) 下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知项目预算单位。

(2) 资料收集与核查。评价人员对项目预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时





积极利用各种公开数据资料与项目预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）非现场评价。对各项目预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并收取问卷调查。通过对被调查对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

（4）现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价，主要包括。

a 听取情况介绍。听取项目预算单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

b 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c 资料核查。根据项目预算单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果通过查阅相关资料等手段，对项目预算单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

d 分析评价。以项目预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目预算单位的项目决策、管理和绩效等方面进行分析



评价, 计算项目绩效得分, 总结项目的成效与存在问题, 进行相关原因分析。

(5) 形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成项目绩效评价结果。评价小组重点的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时, 对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核, 全面了解和掌握项目实施进度, 了解申报资金的使用、管理及效益情况, 确保评价结果的真实性。

3、综合分析及评价报告撰写: 包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价项目的基本情况, 明确项目绩效目标, 在全面分析评价资料的基础上, 对绩效目标实现程度, 对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价, 对项目绩效与存在问题的分析, 力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确, 所提建议具有针对性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后, 评价小组与预算单位进行沟通, 征询其意见, 此并非预算单位干涉工作组的职业判断, 而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿, 上报委托单位。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见, 对评价报告进行修改完善。在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿, 含摘要, 提交委托方。



#### 4. 评价方法

正确的评价方法是评价评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，评价小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

在指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

#### （五）绩效评价指标体系及标准

通过对该项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部、自治区财政厅以及玛纳斯县财政局相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件 1。





### 三、绩效评价综合情况及结论

#### （一）绩效评价综合结论

通过对玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 97 分，评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 2 项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	14	93.33%
项目管理	25	23	92%
项目产出	30	30	100%
项目效益	30	30	100%
合计	100	97	97%

#### （二）绩效目标实现情况

通过对重新梳理后设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目的绩效目标与绩效指标实际完成情况列表如下：

表 3 项目绩效目标与绩效指标实际完成情况表

2023 年年度目标	2023 年年度目标完成情况
------------	----------------





项目拟投入 2000 万元，主要实施内容为：改造装修手术室、化验室、医废处置间、档案室等共计 2000 平方米，改造楼层中央空调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施，购置医疗设备，通过项目实施有效改善妇幼保健医疗条件，提升妇幼保健服务水平，使受益对象满意度达到 90% 以上。

项目已投入 2000 万元，已完成改造装修手术室、化验室、医废处置间、档案室等共计 2975.35 平方米，改造楼层中央空调、污水处理、新风系统、电梯等设备设施，购置医疗设备 30 台（套），通过项目实施有效改善妇幼保健医疗条件，提升妇幼保健服务水平，受益对象满意度达到 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	妇计中心改造装修面积	≥ 2000 平方米	2975.35 平方米
		采购医疗设备数量	≥ 30 台（套）	30 台（套）
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%
	时效指标	工程开工及时率	=100%	100%
		工程完工及时率	=100%	100%
		资金支付及时率	=100%	100%
	成本指标	土建及安装费用	≤ 860.23 万元	860.23 万元
		设备购置费用	≤ 1139.77 万元	1139.77 万元
效益指标	社会效益指标	改善妇幼保健医疗条件	有效改善	有效改善
		提升妇幼保健服务水平	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	100%

#### 四、绩效评价情况分析

##### （一）项目决策情况



项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率为 93.33%。

表 4 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
小计			15	14	93.33%

#### 1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

##### (1) 立项依据充分性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关事业发展政策，项目实施内容与预算单位部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目支出符合公共财政要求和财政供给范围，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据比较充分。



## (2) 立项程序规范性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。该项目支出预算按照规定的程序申请，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表和事前绩效评估报告，项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。

## 2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。

### (1) 绩效目标合理性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。项目预算单位按照自治区、玛纳斯县财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标具备合理性。

### (2) 绩效指标明确性

指标分值 2 分，评价得 1 分。项目预算单位在设定绩效指标时，通过分析项目绩效目标表发现存在指标设置不够科学、全面的情况，如原数量指标仅设置为“改造装修面积=2000 平方米”无法有效考核项目中的设备购置工作，原成本指标“债券资金投入=2000 万元”，未能细化成本指标，未能体现出项目细分支出方向。

## 3. 资金投入



该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

(1) 预算编制科学性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。

(2) 资金分配合理性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。该项目预算资金分配依据资金文件以及合同确定，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

(二) 项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 25 分，评价得分 23 分，得分率为 92%。

表 5 项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目管理	资金管理	资金到位率	4	4	100%
		年度预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	2	50%
		制度执行有效性	4	4	100%
		绩效监控有效性	2	2	100%
		自评报告规范性与整改反馈及时性	2	2	100%





一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
小计			25	23	92%

## 1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 13 分，评价得分 13 分，得分率为 100%。

### (1) 资金到位率

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目预算资金 2000 万元，实际到位 2000 万元，资金到位率为 100%。指标分值 4 分，根据评分标准该指标评价得分 4 分。

### (2) 年度预算执行率

截止 2023 年 12 月 31 日，玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目实际支出资金总额为 2000 万元，预算资金执行率为 100%。指标分值 5 分，根据评分标准该指标评价得分 5 分。

### (3) 资金使用合规性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。通过查看预算单位财务资料，该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的开支范围，资金的拨付拥有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途，财政直接支付凭证金额与审核金额和发票金额一致。

## 2. 组织实施



该指标涉及 4 个三级指标，分值 12 分，评价得分 10 分，得分率为 83.33%。

(1) 管理制度健全性

指标分值 4 分，评价得分 2 分。预算单位沿用玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心的各项内控制度，具有相应的财务和项目管理制度，各项管理制度合法、合规、完整，但未依据本建设项目的功能特性就规范该项目建设及管理制定专门的内控管理措施。

(2) 制度执行有效性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目在项目领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位，资料齐全并归档及时。

(3) 绩效监控有效性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。预算单位按要求在项目执行过程中开展了绩效运行监控工作并向财政部门报送了监控时点的绩效监控表，绩效监控数据及资料归集整理与分析严谨，能对发现的问题及时采取有效措施整改纠偏。

(4) 自评规范性与整改反馈及时性

指标分值 2 分，评价得分 2 分。经核查项目绩效系统，预算单位按照财政部门及预算资金使用要求，于 2024 年 4 月对项目预算执行情况与绩效指标完成情况开展项目绩效自评及时开展项目支出绩效自评。

(三) 项目产出情况



项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

表 6 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目产出	产出数量	妇计中心改造装修面积	5	5	100%
		采购医疗设备数量	5	5	100%
	产出质量	工程验收合格率	5	5	100%
	产出时效	工程开工及时率	2	2	100%
		工程完工及时率	2	2	100%
		资金支付及时率	1	1	100%
	产出成本	土建及安装费用	5	5	100%
		设备购置费用	5	5	100%
小计			30	30	100%

### 1. 产出数量

该指标涉及 3 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

#### (1) 妇计中心改造装修面积

通过对项目合同、竣工验收报告等资料进行核对，该项目实际完成妇计中心改造装修面积 2975.35 平方米，完成率 148.77%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准，评价得 5 分。

#### (2) 采购医疗设备数量



通过对项目合同、设备移交单等资料进行核对，该项目实际完成医疗设备采购数量 30 台（套），完成率 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准，评价得 5 分。

## 2. 产出质量

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分。通过对项目合同、竣工验收报告等资料进行核对，该项目工程验收合格率为 100%，完成率为 100%，完成设定绩效指标。

## 3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

### （1）工程开工及时率

通过对项目合同、竣工验收报告等资料进行核对，该项目实际在 2023 年 4 月 8 日开工，符合合同工期要求的计划开工时间。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

### （2）工程完工及时率

通过对项目合同、竣工验收报告等资料进行核对，该项目实际在 2023 年 8 月 31 日完工，符合合同工期要求的计划开工时间。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准，评价得 2 分。

### （3）资金支付及时率





通过对项目合同、资金支付文件等资料进行核对，该项目资金均按照合同约定进度及时支付。

综上所述，该指标分值 1 分，根据评分标准，评价得 1 分。

#### 4. 产出成本

该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

##### （1）土建及安装费用

通过对项目合同、竣工验收报告、资金支付文件等资料进行核对，该项目向施工单位支付土建及安装费用共计 860.23 万元，完成成本控制目标。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准，评价得 5 分。

##### （2）设备购置费用

通过对项目合同、竣工验收报告、资金支付文件等资料进行核对，该项目向施工单位支付土建及安装费用共计 1139.77 万元，完成成本控制目标。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准，评价得 5 分。

##### （四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益和服务对象满意度两个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

表 7 项目效益指标得分情况



一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目效益	社会效益	改善妇幼保健医疗条件	10	10	100%
		提升妇幼保健服务水平	10	10	100%
	服务对象满意度	受益群众满意度	10	10	100%
小计			30	30	100%

### 1. 社会效益

该指标涉及 2 个三级指标，分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

#### (1) 改善妇幼保健医疗条件

根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 50 份。调查问卷中关于“您认为该项目是否有效改善玛纳斯县妇幼保健医疗条件？”的统计情况，其中，选择“效果明显”的人数为 50 人，选择“效果较明显”的人数为 0 人，选择“效果一般”的人数为 0 人，选择“无效果”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率 =  $\sum$  样本数（“效果明显” × 1 + “效果较明显” × 0.8 + “效果一般” × 0.6 + “无效果” × 0.3） / 总样本数 × 100%，本指标完成率 =  $(50 \times 1 + 0 \times 0.8 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.3) / 50 = 100\%$ ，大于 95%，完成设定绩效指标。

#### (2) 提升妇幼保健服务水平

根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 50 份。调查问卷中关于“您认为该项目是否有效提升玛纳斯县妇幼保健服务水平？”的统计情况，其中，选择“效果



明显”的人数为 50 人，选择“效果较明显”的人数为 0 人，选择“效果一般”的人数为 0 人，选择“无效果”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率 =  $\Sigma$  样本数（“效果明显” × 1 + “效果较明显” × 0.8 + “效果一般” × 0.6 + “无效果” × 0.3） / 总样本数 × 100%，本指标完成率 =  $(50 \times 1 + 0 \times 0.8 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.3) / 50 = 100\%$ ，大于 95%，完成设定绩效指标。

## 2. 服务对象满意度

该指标涉及 1 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。根据调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 50 份，调查问卷中关于“您对该项目的实施过程及效果是否满意？”的统计情况，其中，选择“非常满意”的人数为 50 人，选择“比较满意”的人数为 0 人，选择“一般”的人数为 0 人，选择“不满意”的人数为 0 人，根据计算公式：指标完成率 =  $\Sigma$  样本数（“非常满意” × 1 + “比较满意” × 0.8 + “一般” × 0.6 + “不满意” × 0.3） / 总样本数 × 100%，本指标完成率 =  $(50 \times 1 + 0 \times 0.8 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.3) / 50 = 100\%$ ，大于 95%，完成设定绩效指标。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准，评价得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 加强支付流程。财务根据相关领导签字审批单进行支付款，付款手续必须齐全，收款信息必须与合同方信息一致，收取任何款项必须开具收款收据。





2. 加强管理工作，完善财务付款程序及规定，合理控制单位财务支出，对支付工程款、设备购置款与有关部门请示，财务接到审批有效的付款申请单后安排付款。

3. 统筹协调安排，保障资金运行。玛纳斯县财政资金下达至玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心后由单位统筹安排，确保资金及时到位并高效使用，推进项目有序开展及实施。

4. 目标责任落实到位。强化组织、管理、监督职责，进一步明确目标任务，靠实工作责任，加快项目推进，确保按期高质完成项目任务。

## （二）存在的问题

### 1. 绩效目标编制不够科学、全面。

项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。本项目设置了产出指标（含数量、质量、时效、成本）、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。但通过分析项目绩效目标表发现存在指标设置不够科学、全面的情况，如原数量指标仅设置为“改造装修面积=2000 平方米”无法有效考核项目中的设备购置工作，原成本指标“债券资金投入=2000 万元”，未能细化成本指标，未能体现出项目细分支出方向。

### 2. 项目资料整理、归档工作不够及时。

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对佐证材料的需求，需要相关负责人配合提供资料，但部分档案资料不完备未及时提供。





## 六、有关建议

### 1. 提升绩效目标编制水平。

绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与其项目的实施计划相一致，建议项目实施单位在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出目标和效果目标，使目标值与年度任务数或计划数相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。

### 2. 加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性。

建议玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心采取定期与不定期的检查，对必要的信息数据及时采集调研，了解各项工作每个绩效节点应上报的绩效数据，保障数据填报真实性，为预算绩效管理工作提供有效依据。

### 3. 加强档案管理。

建议玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心加强项目前期审批、全过程绩效管理等档案资料及时收集、整理、归档管理，使档案管理工作规范化、标准化。。

## 七、其他需说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

1. 玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实



性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

## （二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。



附件:

1. 项目绩效评价指标体系及评分表
2. 项目资金支付明细表
3. 问卷调查分析报告
4. 相关负责人访谈
5. 项目现场勘察照片
6. 支付凭证

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

2024年7月25日



附件1:

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标				指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)					
名称	名称	名称	权重(%)					
项目决策	15	项目立项	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策(1分);	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责相符,属于部门履职所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	3	100.00%	
				立项依据充分性				
				立项程序规范性				
				绩效目标合理性				
				绩效指标明确性				
	5	资金投入	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。	3	100.00%	
				资金分配合理性				
				资金到位率				
				年度预算执行率				
	13	资金管理	13	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 ①资金到位率为100%,得满分; ②资金到位率在80%-100%之间的,每降低1%扣除对应分值5%的权重分; ③资金到位率低于80%,得0分。	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策(0.5分)。	2	100.00%	



玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标					指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称						权重（%）
项目管理	25			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的审批程序和手续(1分)； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4	100.00%	
				管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分)； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	2	50.00%	未依据本建设项目的功能特性就规范本项目建设制定专门的内控管理措施
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)； ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	4	100.00%	
			组织实施	绩效监控有效性	2	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理，是否根据绩效监控结果采取了调整和改进措施。	①是否定期对项目实施绩效运行监控管理(0.5分)； ②是否定期归集相关监控数据、资料(0.5分)； ③是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施(1分)。	2	100.00%	
				自评报告规范性与整改反馈及时性	2	是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告中存在的问题进行整改反馈。	①是否及时开展了绩效自评(1分)； ②绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全(0.5分)； ③针对存在的问题及时进行了整改反馈(0.5分)。	2	100.00%	
项目产出	30			妇计中心改造装修面积	5	项目实际产出数量是否到达预期设定绩效指标。	产出数量指标完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100% 评分标准： ①完成率为100%及以上的，得满分；②完成率在60%—100%之间的，每降低1%扣除对应分值的权重分；③完成率低于60%的，得0分。	5	100.00%	
			产出数量	采购医疗设备数量	5	项目实际产出数量是否到达预期设定绩效指标。	产出数量指标完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100% 评分标准： ①完成率为100%及以上的，得满分；②完成率在60%—100%之间的，每降低1%扣除对应分值的权重分；③完成率低于60%的，得0分。	5	100.00%	
			产出质量	工程验收合格率	5	项目过程中，土地征收补偿是否合规	项目过程合规，得满分，项目过程不合规的，得0分	5	100.00%	
				工程开工及时率	2	项目是否按照计划开工时间开工建设	项目按计划时间开工的，得满分；未按计划时间开工，得0分	2	100.00%	
				工程完工及时率	2	项目是否按照计划完工时间完工	项目按计划时间完工的，得满分；未按计划时间完工，得0分	2	100.00%	

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）					
项目效益	30	产出成本		资金支付及时率	1	项目资金是否及时支付	项目资金及时支付的，得满分；未按时下达的，得0分	1	100.00%	
				土建及安装费用	5	项目费用成本是否在预定成本指标内	①项目实际成本符合预期设定的成本指标的，得满分； ②项目实际成本存在调整预算情况，调整原因合理，项目实施过程中采取了一定的成本控制措施的，得2-4分； ③项目实际成本与设定成本指标偏差较大的，得0-2分。	5	100.00%	
						项目成本是否控制在预定成本范围内	①项目实际成本符合预期设定的成本指标的，得满分； ②项目实际成本存在调整预算情况，调整原因合理，项目实施过程中采取了一定的成本控制措施的，得2-4分； ③项目实际成本与设定成本指标偏差较大的，得0-2分。	5	100.00%	
		社会效益	30	改善妇幼保健医疗条件	10	项目建成后是否能够改善妇幼保健条件	指标完成率=Σ样本数（“效果明显”×1+“效果较明显”×0.8+“效果一般”×0.6+“无效果”×0.3）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	10	100.00%	
				提升妇幼保健服务水平	10	项目建成后是否能够提升妇幼保健服务水平	指标完成率=Σ样本数（“效果明显”×1+“效果较明显”×0.8+“效果一般”×0.6+“无效果”×0.3）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	10	100.00%	
				受益群众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	10	100.00%	

附件2:

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目资金支付明细表

单位: 元

序号	支付时间	支付金额	拨付单位	支付单位
1	2023年3月29日	1,006,800.00	玛纳斯财政局	承德远东建设集团有限公司新疆分公司
2	2023年4月25日	671,200.00	玛纳斯财政局	承德远东建设集团有限公司新疆分公司
3	2023年5月17日	671,200.00	玛纳斯财政局	承德远东建设集团有限公司新疆分公司
4	2023年5月24日	1,006,800.00	玛纳斯财政局	承德远东建设集团有限公司新疆分公司
5	2023年3月30日	455,340.00	玛纳斯财政局	河南芯亿科医疗科技有限公司玛纳斯分公司
6	2023年5月17日	910,680.00	玛纳斯财政局	河南芯亿科医疗科技有限公司玛纳斯分公司
7	2023年5月24日	151,780.00	玛纳斯财政局	河南芯亿科医疗科技有限公司玛纳斯分公司
8	2023年3月30日	269,400.00	玛纳斯财政局	江西书堂贸易有限公司玛纳斯分公司
9	2023年5月18日	538,800.00	玛纳斯财政局	江西书堂贸易有限公司玛纳斯分公司
10	2023年5月24日	89,800.00	玛纳斯财政局	江西书堂贸易有限公司玛纳斯分公司
11	2023年3月30日	804,000.00	玛纳斯财政局	乌鲁木齐瑞康福来医疗器械有限公司玛纳斯分公司
12	2023年5月24日	1,876,000.00	玛纳斯财政局	乌鲁木齐瑞康福来医疗器械有限公司玛纳斯分公司
13	2023年3月30日	375,540.00	玛纳斯财政局	新疆昶朗商贸有限公司玛纳斯分公司
14	2023年5月16日	751,080.00	玛纳斯财政局	新疆昶朗商贸有限公司玛纳斯分公司
15	2023年5月24日	125,180.00	玛纳斯财政局	新疆昶朗商贸有限公司玛纳斯分公司
16	2023年4月19日	298,500.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
17	2023年4月25日	199,000.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
18	2023年5月17日	398,000.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
19	2023年5月24日	99,500.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
20	2023年3月29日	822,930.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
21	2023年4月25日	548,620.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
22	2023年5月17日	1,234,395.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
23	2023年5月24日	137,155.00	玛纳斯财政局	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司



附件2：

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目资金支付明细表

单位：元

序号	支付时间	支付金额	拨付单位	支付单位
24	2023年5月23日	578,890.52	玛纳斯财政局	新疆龙城建设工程有限公司玛纳斯分公司
25	2023年5月24日	1,287,409.48	玛纳斯财政局	新疆龙城建设工程有限公司玛纳斯分公司
26	2023年4月19日	1,014,000.00	玛纳斯财政局	新疆雅锐建筑工程有限公司玛纳斯分公司
27	2023年5月17日	1,352,000.00	玛纳斯财政局	新疆雅锐建筑工程有限公司玛纳斯分公司
28	2023年5月24日	1,014,000.00	玛纳斯财政局	新疆雅锐建筑工程有限公司玛纳斯分公司
29	2023年3月30日	393,600.00	玛纳斯财政局	新疆云端致派商贸有限公司玛纳斯分公司
30	2023年5月18日	787,200.00	玛纳斯财政局	新疆云端致派商贸有限公司玛纳斯分公司
31	2023年5月24日	131,200.00	玛纳斯财政局	新疆云端致派商贸有限公司玛纳斯分公司
合计		20,000,000.00		



### 附件 3：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为群众服务”原理，引入“改善玛纳斯县妇幼保健医疗条件”、“受益群众满意度”等效益指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

#### 1. 调研对象

本次调研的受益对象为妇计中心诊疗医生与就诊群众。

#### 2. 调研内容

（1）玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目实施后的满意度，包括对项目的了解情况、该项目实施是否能够改善玛纳斯县妇幼保健医疗条件。

（2）玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

#### 3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

#### 4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，以受益群众为对象随机抽取 50 人为样本，发放问卷 50 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调研在玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心的协调配合下，组织安排线下纸质问卷的发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价小组实际发放问卷 50 份，回收问卷 50 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 50 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

（1）您是否了解玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目？

选项	反馈数量	占比
是	50	100%
否	0	0%

（2）您认为该项目是否有效改善玛纳斯县妇幼保健医疗条件？

选项	反馈数量	占比
效果明显	50	100%
效果较明显	0	0%

选项	反馈数量	占比
效果一般	0	0%
无效果	0	0%

（3）您认为该项目是否有效提升玛纳斯县妇幼保健服务水平？

选项	反馈数量	占比
效果明显	50	100%
效果较明显	0	0%
效果一般	0	0%
无效果	0	0%

（4）您认为该项目是否有效提高了玛纳斯县医疗服务质量？

选项	反馈数量	占比
效果明显	50	100%
效果较明显	0	0%
效果一般	0	0%
无效果	0	0%

（5）您对该项目的实施过程及效果是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	50	100%
比较满意	0	0%

选项	反馈数量	占比
一般	0	0%
不满意	0	0%

（6）您对于该项目的实施是否有问题或者建议？

无。



## 附件 4： 相关负责人访谈

### 玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目访谈报告

#### 一、访谈目的

2023 年玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心在各级领导的大力支持下，实施了玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目，项目实施过程中，玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心不断摸排梳理存在的问题，改善了当地广大农民 群众看病环境和就医条件，解决了妇计中心医院现有业务用房狭窄或缺陷的问题，将使妇计中心医院卫生医疗条件和工作条件得到较大的改善。

本次绩效评价旨在通过该项目资金的主管单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目资金使用的公平性和合理性建言献策。

#### 二、访谈对象

预算主管单位：玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心

#### 三、访谈内容

玛纳斯县妇计中心妇女儿童服务能力提升项目开展情况及必要性、项目资金保障情况、项目开展取得的成效及执行过程中遇到的主要困难和项目的下一步规划。

#### 四、访谈分析

## 1. 请您谈谈本单位此项目的背景、内容及规模

随着玛纳斯县经济的稳步增长，群众的收入和生活水平不断改善，健康需求日益提高，到医院就医的患者越来越多。近几年来，政府不断加强基层医疗机构建设，使群众的基本医疗需求得到保障。但县级医院妇产科、儿科资源缺乏，服务能力不足，妇女儿童看病难、住院难的问题突出。该项目的实施具有政策、技术、管理、区位、交通、规模、环境等多方面的资源优势，设计起点高、服务能力强，对解决全县妇女儿童看病难住院难问题、促进玛纳斯县妇幼卫生事业发展都具有明显的作用，能够收到良好的效益。

项目建设完成后，将使妇计中心医院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋的设备配置上满足妇计中心医院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用，极大地改善了当地广大农民群众看病环境和就医条件。该项目的实施，解决了妇计中心医院现有业务用房狭窄或缺陷的问题，将使妇计中心医院卫生医疗条件和工作条件得到较大的改善，有利于提高当地群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。社会效益突出，经济效益较好。

## 2. 请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 2000 万元，全年预算数 2000 万元，实际总投入 2000 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为专项债券资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 2000 万元，全年预算数 2000

万元，全年执行数 2000 万元，预算执行率为 100%。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

我单位对专项资金的管理严格按照《玛纳斯妇幼保健计划生育服务中心财务管理办法》，对专项资金进行单独核算，严格审核把控经费开支范围，严格按照经费预算执行。

4. 请您谈谈设立此项目的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？


设立此项目是为解决全县妇女儿童看病难住院难问题、妇计中心医院现有业务用房狭窄或缺陷的问题，项目实施后有效改善玛纳斯县妇幼保健医疗条件，有效提升玛纳斯县妇幼保健服务水平，达到预期效果。

5. 请您谈谈此项目实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。


未来争取加强专项资金管理，加强资金监管力度，提高财政资金使用效益。




## 附件 5：现场勘查照片

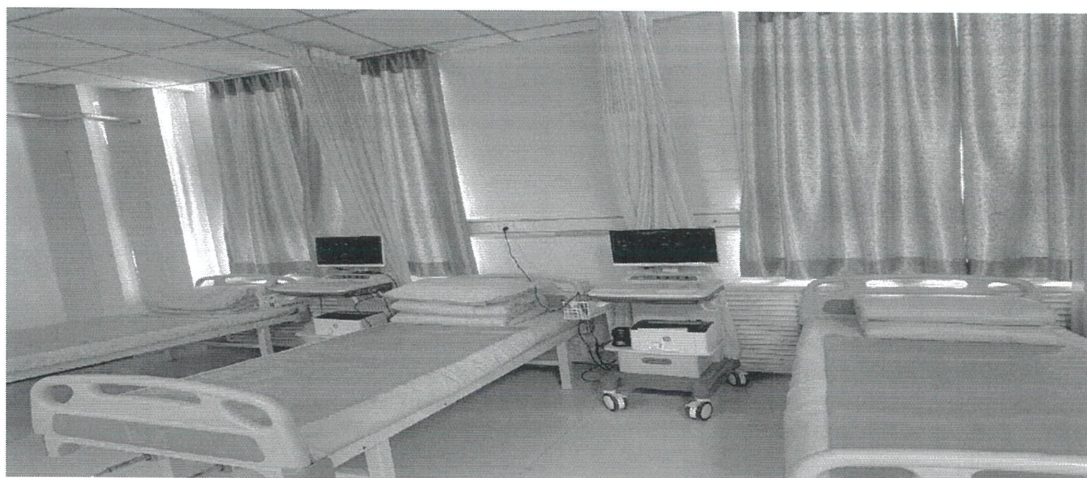

图片 1：现场勘查照片（1）

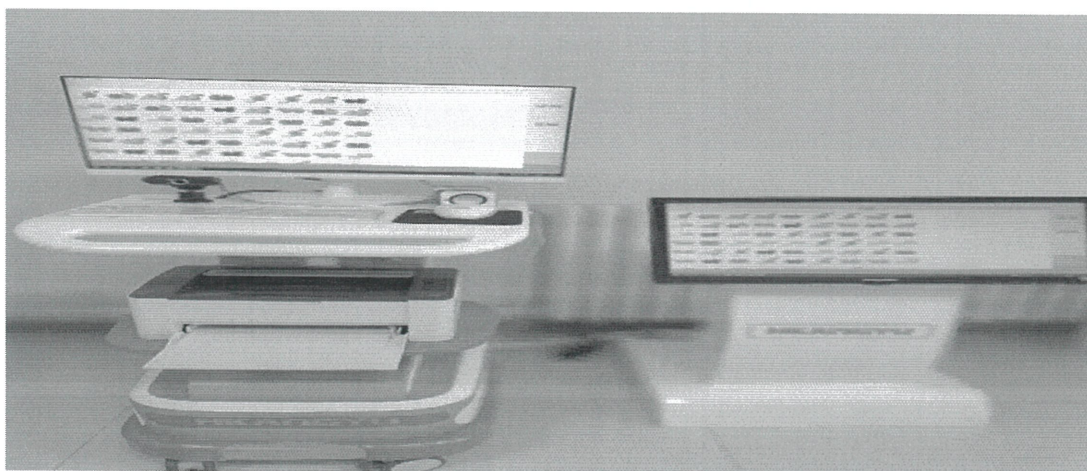

图片 2：现场勘查照片（2）

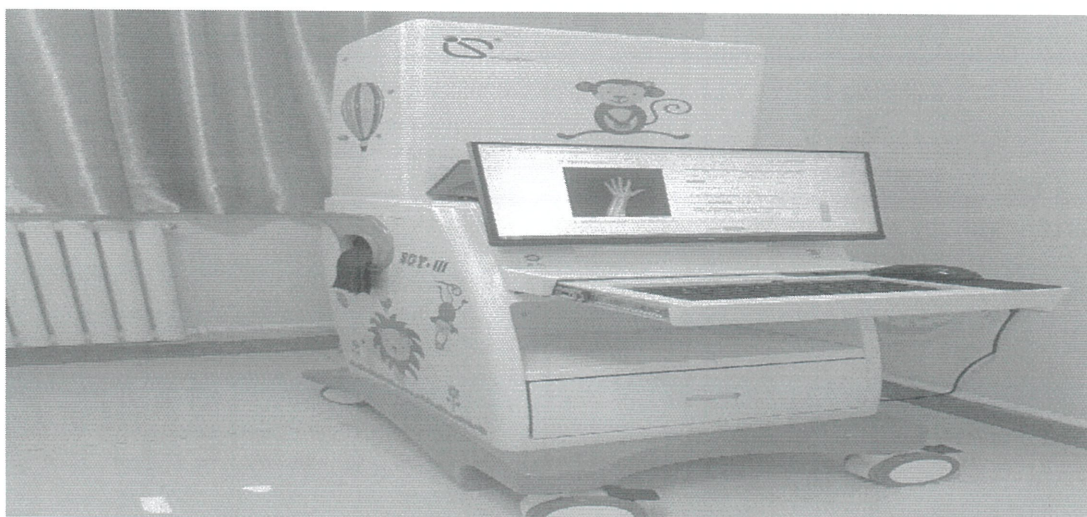


图片 3：现场勘查照片（3）






图片 4：现场勘查照片（4）

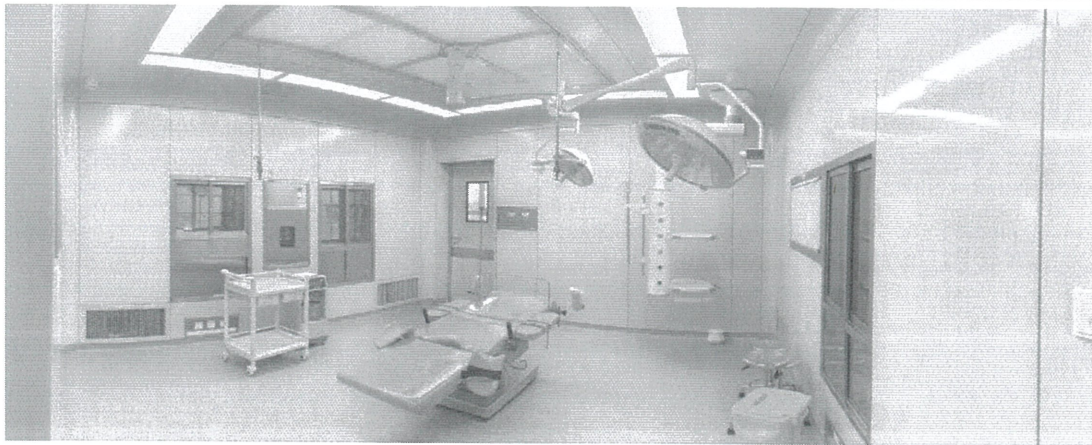



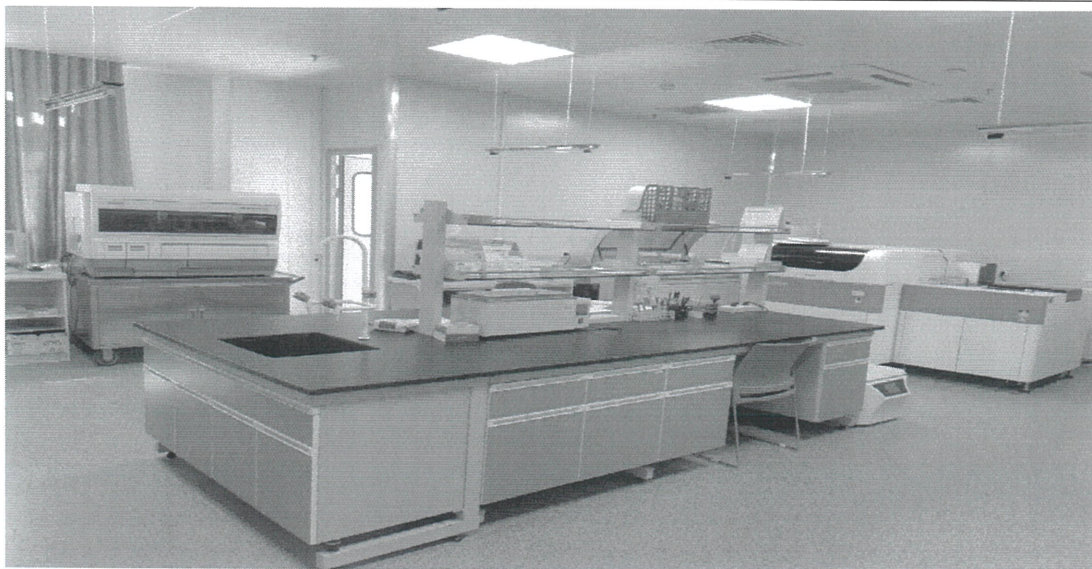

图片 5：现场勘查照片（5）



图片 6：现场勘查照片（6）

附件 6：支付凭证

652324		国库集中支付凭证		第 DP2023032900099 号	
资金性质：政府性基金预算资金		20230329		单位：元	
付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	承德远东建设集团有限公司新疆分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017889
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)：壹佰万零陆仟捌佰元整			金额 (小写)：¥1,006,800.00	
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230329180455704	
结算方式	其他		用 途	3月份妇计中心支付功能用房深化工程款	
 支付印章：兵杨印红 运裴印颐			银行会 计 分 录	实际支付金额：¥1,006,800.00 (借) 复核员： 	

652324		国库集中支付凭证		第 DP2023042500048 号	
资金性质：政府性基金预算资金		20230425		单位：元	
付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	承德远东建设集团有限公司新疆分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017889
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)：陆拾柒万壹仟贰佰元整			金额 (小写)：¥671,200.00	
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230424173131996	
结算方式	其他		用 途	4月份妇计中心支付功能用房深化工程款	
 支付印章：兵杨印红 运裴印颐			银行会 计 分 录	实际支付金额：¥671,200.00 (借) 复核员： 	



国库集中支付凭证





652324

第 DP2023051700244 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	承德远建设集团有限公司新疆分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017889
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写)： 陆拾柒万壹仟贰佰元整				金额 (小写)： ¥671,200.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230517123254318	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付功能用房深化工程款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥671,200.00 (借) 复核员：	
					
			他项无效		

国库集中支付凭证




652324

第 DP2023052400017 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	承德远建设集团有限公司新疆分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017889
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写)： 壹佰万零陆仟捌佰元整				金额 (小写)： ¥1,006,800.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523174958885	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付功能用房深化项目款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥1,006,800.00 (借) 复核员：	
					
			他项无效		

652324



## 国库集中支付凭证

资金性质：政府性基金预算资金

20230329

第 DP2023032900003 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	河南芯亿科医疗科技有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017780
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支 付 金 额	人民币 (大写)：肆拾伍万伍仟叁佰肆拾元整				金额 (小写) ¥455,340.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230329125649470	
结算方式	其他		用 途	3月份妇计中心支付儿童骨骼检测仪器款	
 兵杨印红 运裴印颐			银行会 计分 录	实际支付金额：¥455,340.00 (借) 复核员： 	

652324



## 国库集中支付凭证

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

第 DP2023051700247 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	河南芯亿科医疗科技有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017780
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支 付 金 额	人民币 (大写)：玖拾壹万零陆佰捌拾元整				金额 (小写) ¥910,680.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230517124017601	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付儿童骨骼检测仪器	
 兵杨印红 运裴印颐			银行会 计分 录	实际支付金额：¥910,680.00 (借) 复核员： 	



# 国库集中支付凭证





652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

第 DP2023052400019 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	河南芯亿科医疗科技有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017780
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)： 壹拾伍万壹仟柒佰捌拾元整				金额 (小写)： ¥151,780.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523175257903	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付儿童骨骼检测仪器款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥151,780.00 (借) 复核员：	
					

# 国库集中支付凭证





652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230330

第 DP2023033000003 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	江西书堂贸易有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017806
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)： 贰拾陆万玖仟肆佰元整				金额 (小写)： ¥269,400.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230330115758032	
结算方式	其他		用 途	3月份妇计中心支付儿童筛查仪器款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥269,400.00 (借) 复核员：	
					

652324





## 国库集中支付凭证

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

第 DF2023051700242 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	江西书堂贸易有限公司玛纳斯分公司	
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017806	
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行	
支 付 金 额	人民币 (大写):	伍拾叁万捌仟捌佰元整			金 额 (小写)	¥538,800.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230517122820832		
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付儿童筛查仪器款		
  			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥538,800.00 (借)		
			复核员： 			

652324





## 国库集中支付凭证

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

第 DF2023052400016 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	江西书堂贸易有限公司玛纳斯分公司	
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017806	
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行	
支 付 金 额	人民币 (大写):	捌万玖仟捌佰元整			金 额 (小写)	¥89,800.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523173235934		
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付儿童筛查仪器款		
  			银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥89,800.00 (借)		
			复核员： 			

国库集中支付凭证




652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230329

第 DP2023032900008 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	乌鲁木齐瑞康福来医疗器械有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017871
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支 付 金 额	人民币 (大写)：捌拾万零肆仟元整				金额 (小写) ¥804,000.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230329171039765	
结算方式	其他		用 途	3月份妇计中心支付四维彩超款	
  			银行会 计分 录	实际支付金额：¥804,000.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

第 DP2023052400014 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	乌鲁木齐瑞康福来医疗器械有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017871
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支 付 金 额	人民币 (大写)：壹佰捌拾柒万陆仟元整				金额 (小写) ¥1,876,000.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523172928916	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付四维彩超款	
  			银行会 计分 录	实际支付金额：¥1,876,000.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230329

第 DP2023032900004 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆利朗商贸有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017764
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支 付 金 额	人民币 (大写)：叁拾柒万伍仟伍佰肆拾元整				金额 (小写) ¥375,540.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230329130216021	
结算方式	其他		用 途	3月份妇计中心支付妇科仪器款	
  			银行会 计分 录	实际支付金额：¥375,540.00 (借) 复核员： 	







国库集中支付凭证

第 DP2023051700248 号  
单位：元

652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆顺朗商贸有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017764
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写):	柒拾伍万壹仟零捌拾元整	金额 (小写)		¥751,080.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230517124209391	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付妇科仪器款	
  			银行	实际支付金额：¥751,080.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	





国库集中支付凭证

第 DP2023052400021 号  
单位：元

652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆顺朗商贸有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017764
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写):	壹拾贰万伍仟叁佰捌拾元整	金额 (小写)		¥125,180.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523175609388	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付妇科仪器款	
  			银行	实际支付金额：¥125,180.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	





国库集中支付凭证

第 DP2023041900152 号  
单位：元

652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230419

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017768
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写):	贰拾玖万捌仟伍佰元整	金额 (小写)		¥298,500.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230419112450914	
结算方式	其他		用 途	妇计中心支付中央变频空调购置款	
  			银行	实际支付金额：¥298,500.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	



# 国库集中支付凭证





652324

第 DP2023042500047 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230425

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017798
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)： 壹拾玖万玖仟元整				金额 (小写)
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心				主管部门
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				支付申请编号
结算方式	其他				用 途
  				银行	实际支付金额：¥199,000.00
				会 计	(借)
				分 录	复核员： 

# 国库集中支付凭证





652324

第 DP2023051700245 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017798
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)： 叁拾玖万捌仟元整				金额 (小写)
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心				主管部门
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				支付申请编号
结算方式	其他				用 途
  				银行	实际支付金额：¥398,000.00
				会 计	(借)
				分 录	复核员： 

# 国库集中支付凭证





652324

第 DP2023052400018 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017798
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)： 玖万玖仟伍佰元整				金额 (小写)
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心				主管部门
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				支付申请编号
结算方式	其他				用 途
  				银行	实际支付金额：¥99,500.00
				会 计	(借)
				分 录	复核员： 

国库集中支付凭证





652324

第 DP2023032900005 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230329

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017798
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写):	捌拾贰万贰仟玖佰叁拾元整	金额 (小写)		¥822,930.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230329130510864	
结算方式	其他		用 途	3月份妇计中心支付改建污水系统工程款	
  			银行	实际支付金额：¥822,930.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

第 DP2023042500046 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230425

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017798
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写):	伍拾肆万捌仟陆佰贰拾元整	金额 (小写)		¥548,620.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230424170500198	
结算方式	其他		用 途	4月份妇计中心支付改建污水系统工程款	
  			银行	实际支付金额：¥548,620.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

第 DP2023051700243 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017798
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写):	壹佰贰拾叁万肆仟叁佰玖拾伍元整	金额 (小写)		¥1,234,395.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230517123040152	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付改建污水系统工程款	
  			银行	实际支付金额：¥1,234,395.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

第 DP2023052400020 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆良宇建设集团有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017798
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 壹拾叁万柒仟壹佰伍拾伍元整 (大写):				金额(小写) ¥137,155.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523175427598	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付改建污水系统工程款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥137,155.00 (借)	
				复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

第 DP2023052300002 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230523

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆龙城建设工程有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040018143
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 伍拾柒万捌仟捌佰玖拾元伍角贰分 (大写):				金额(小写) ¥578,890.52
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230522190535796	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付给水管网项目款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥578,890.52 (借)	
				复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

第 DP2023052400015 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆龙城建设工程有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040018143
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 壹佰贰拾陆万柒仟肆佰玖拾元肆角捌分 (大写):				金额(小写) ¥1,267,409.48
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523173417471	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付给水管网项目款	
  			银行会计分录	实际支付金额：¥1,267,409.48 (借)	
				复核员： 	



国库集中支付凭证





652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230419

第 DP2023041900161 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆雅锐建筑工程有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017954
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)：壹佰零壹万肆仟元整				金额 (小写)：¥1,014,000.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230419113754047	
结算方式	其他		用 途	妇计中心支付改扩建工程项目	
  			银行	实际支付金额：¥1,014,000.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

第 DP2023051700246 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆雅锐建筑工程有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017954
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)：壹佰叁拾伍万贰仟元整				金额 (小写)：¥1,352,000.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230517123738678	
结算方式	其他		用 途	妇计中心支付5月改扩建工程款	
  			银行	实际支付金额：¥1,352,000.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

第 DP2023052400013 号

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆雅锐建筑工程有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017954
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯支行
支付金额	人民币 (大写)：壹佰零壹万肆仟元整				金额 (小写)：¥1,014,000.00
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230523175855661	
结算方式	其他		用 途	妇计中心6月支付改扩建工程项目款	
  			银行	实际支付金额：¥1,014,000.00	
			会 计	(借)	
			分 录	复核员： 	



国库集中支付凭证





652324

第 DP2023032900002 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230329

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆云端致派商贸有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017772
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写): 叁拾玖万叁仟陆佰元整	金额 (小写) ¥393,600.00			
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230329125353572	
结算方式	其他		用 途	3月份妇计中心支付检测设备款	
  			银行会 计 分 录	实际支付金额：¥393,600.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证





652324

第 DP2023051700240 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230517

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆云端致派商贸有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017772
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写): 柒拾捌万柒仟贰佰元整	金额 (小写) ¥787,200.00			
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230517124635211	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付检测设备款	
  			银行会 计 分 录	实际支付金额：¥787,200.00 (借) 复核员： 	

国库集中支付凭证




652324

第 DP2023052400012 号

资金性质：政府性基金预算资金

20230524

单位：元

付款人	全 称	玛纳斯县财政局	收款人	全 称	新疆云端致派商贸有限公司玛纳斯分公司
	账 号	3004210029200018596		账 号	30040101040017772
	开户银行	中国工商银行股份有限公司玛纳斯支行		开户银行	中国农业银行股份有限公司玛纳斯县支行
支付金额	人民币 (大写): 壹拾叁万叁仟贰佰元整	金额 (小写) ¥131,200.00			
单 位	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心	
功能分类科目	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		支付申请编号	AP20230524175725353	
结算方式	其他		用 途	妇计中心5月支付检测设备款	
  			银行会 计 分 录	实际支付金额：¥131,200.00 (借) 复核员： 
